

CLIENT :

Chalon sur Saône.

NATURE DE L'INSPECTION :

Inspection de la toiture de l'immeuble situé [redacted] Chalon sur Saône.

CONDITIONS DE L'EXPERTISE ET MATERIEL UTILISÉ :

Inspection de la toiture le 15 novembre 2023 à partir de 11h00.

Hauteur de vol maximum de 25m.

Drone DJI MAVIC 3 Ciné, numéro d'enregistrement : UAS-FR-340154.

RÉSULTAT DE L'EXPERTISE :

Pan côté rue [redacted] : Décalage de plusieurs tuiles et présence d'une tuile fêlée.

Pan côté rue [redacted] : Décalage des tuiles de rive sur la partie supérieure, décalage de tuiles, 2 tuiles cassées, tuiles décrochées.

Pan côté opposé rue [redacted] n°1 : Nombreuses tuiles cassées et décrochées.

Pan côté opposé rue [redacted] n°2 : Sans observation.

Pan côté opposé [redacted] : Nombreuses tuiles cassées et décrochées.

NOM

G. TALPIN

DATE

15 nov. 2023

VISA

Pan de toiture côté rue

Tuiles décalées et mauvais chevauchement dans la zone supérieure de l'ouverture.

NOM
G. TALPIN

DATE
15 nov. 2023

VISA


Pan de toiture côté

Tuiles décalées sur la partie basse à droite du pan.

NOM
G. TALPIN

DATE
15 nov. 2023

VISA


Pan de toiture côté


Décalage de tuiles et présence d'une tuile fêlée à droite du pan sur la mi-hauteur (rangée de tuiles sous l'ouverture).

NOM
G. TALPIN

DATE
15 nov. 2023

VISA


Pan côté

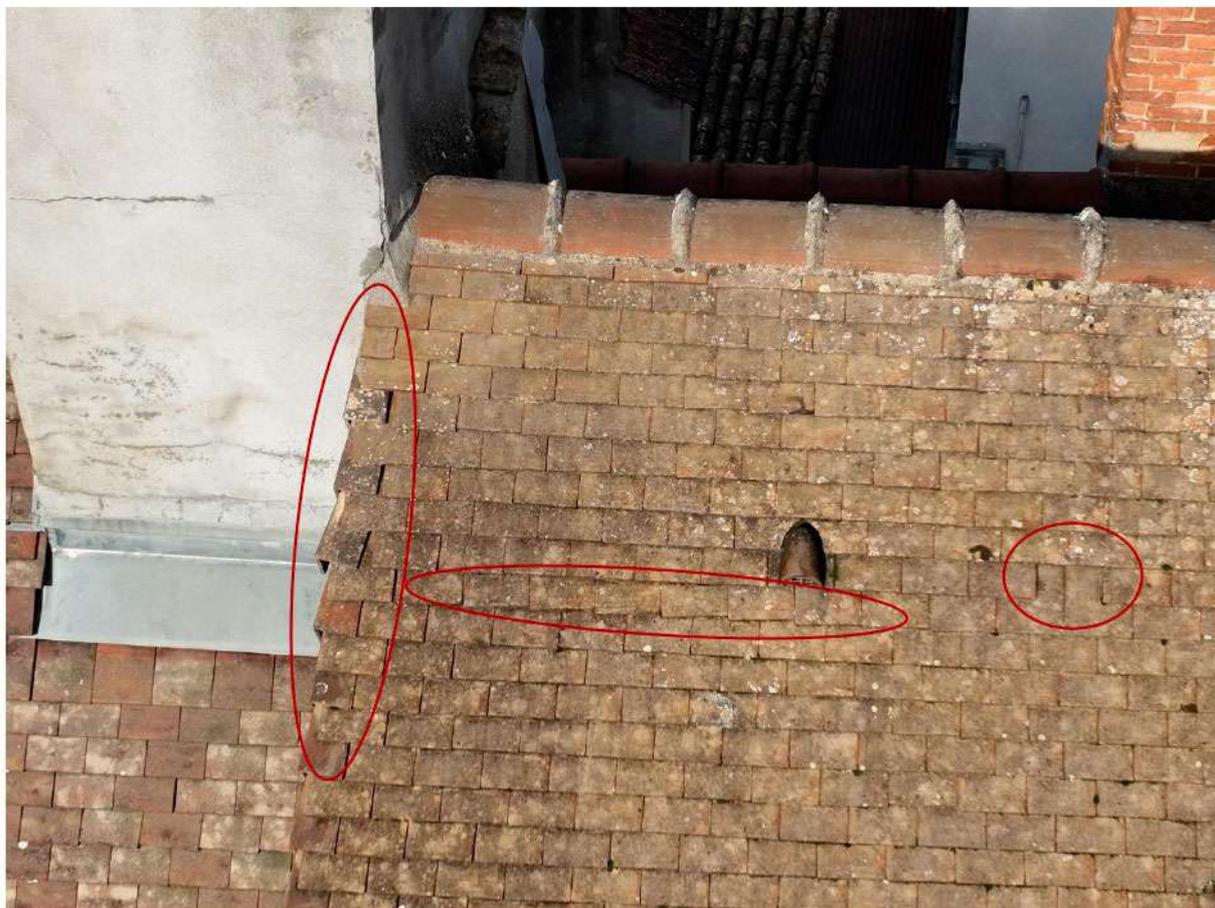


Décalage des tuiles de rive à gauche du pan, absence d'une tuile et décalage de tuiles sur une rangée.

NOM
G. TALPIN

DATE
15 nov. 2023

VISA


Pan côté opposé rue

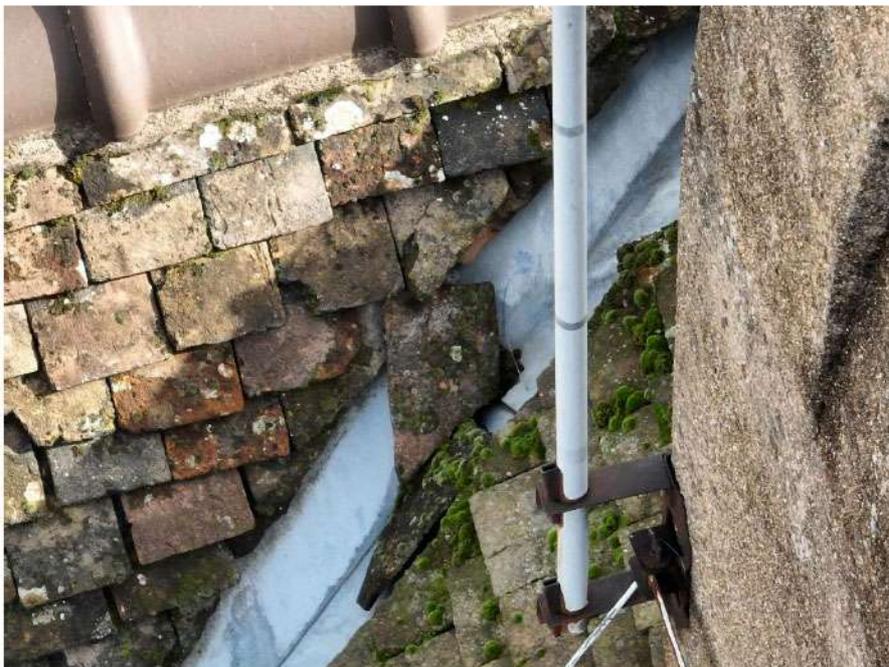

Nombreuses tuiles cassées et décrochées.

NOM
G. TALPIN

DATE
15 nov. 2023

VISA
